




BAUSTELLENSTEUERUNG MIT DIME S 8

DIE LÖSUNG, DIE AUCH AUF DER BAUSTELLE SINN MACHT.

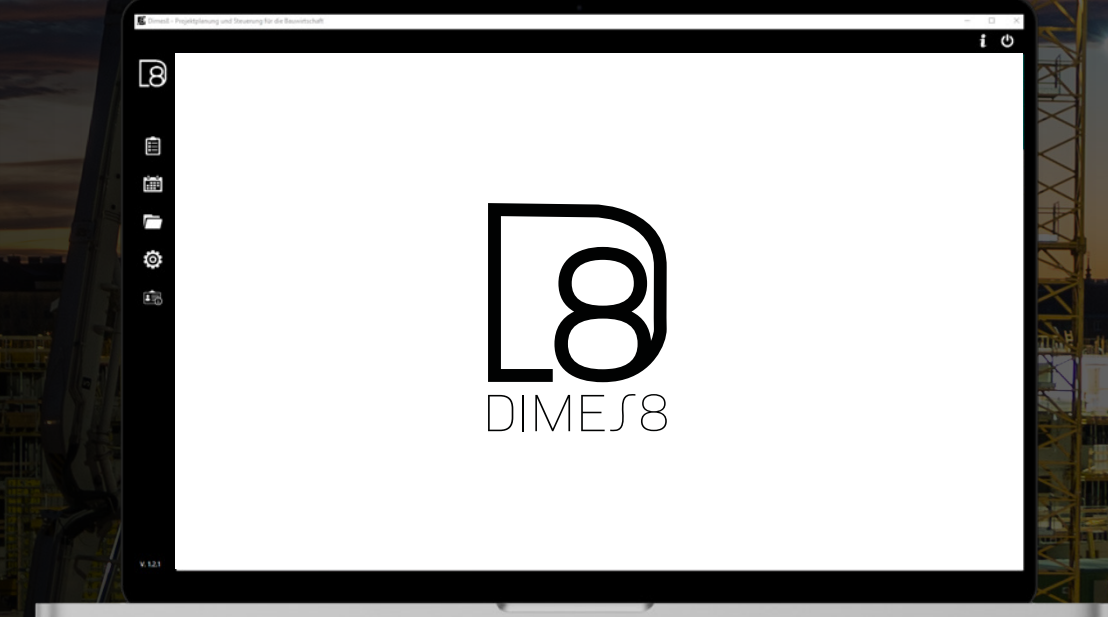

1 | DESHALB BESSER MIT DIMES8

Auf der Basis von Vorlagen und weniger Eingangsdaten, werden Bauablaufpläne **innerhalb weniger Minuten** automatisch erstellt.


Dargestellt in **S-Kurven, Gantt-Diagrammen und Reports**, sehen Sie jederzeit den geplanten und den aktuellen Stand der Bauarbeiten.

So geht's mit DIMES 8:

- ✓ Sie machen Ihre Arbeit
- ✓ Einteilung der Ausführungsmannschaft mit Aufgabenzuteilung
- ✓ Disposition von Material, Gerätschaften und Subunternehmern
- ✓ Vordispositionen in Vorausschau zur Organisation des Arbeitsvorrates



Die Steuerung der Ausführungskapazitäten und deren Arbeitsvorrat ist die einzige Möglichkeit der Einflussnahme auf den Bauablauf.

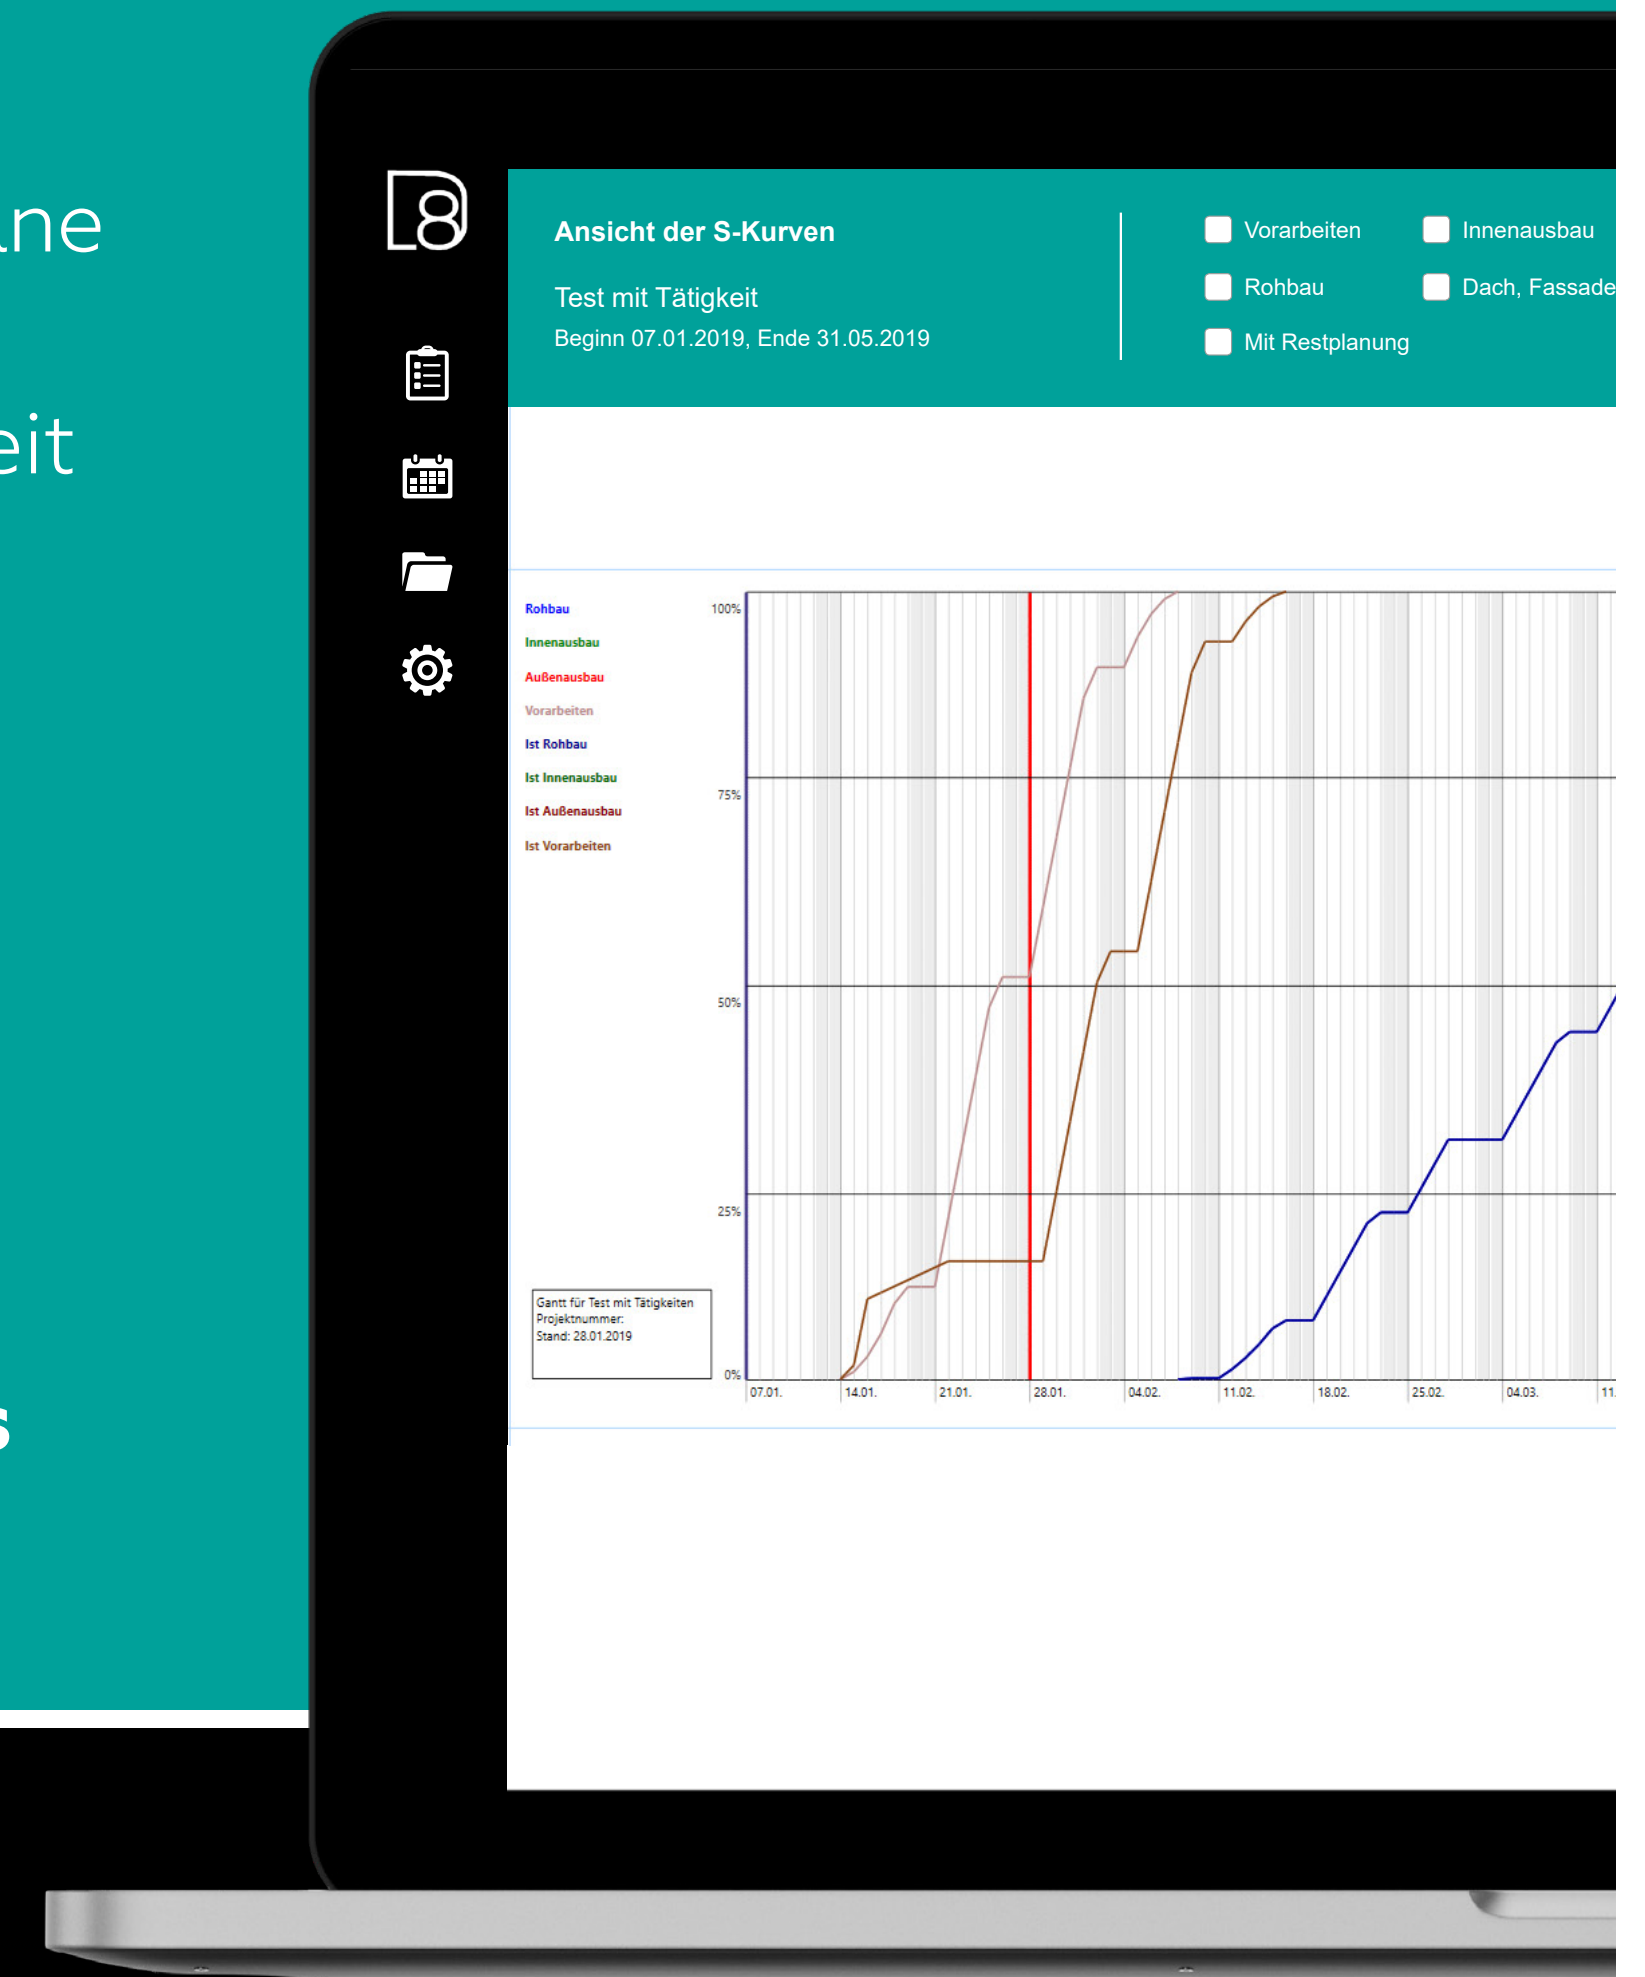

2 | ENTSCHEIDUNGEN ANHAND DER REALITÄT TREFFEN

Bei DIMES 8 genügt es, neben Personal- und Materialeinsatz, den jeweiligen Fertigstellungsgrad von Tätigkeiten **im Tagesbericht** mitzuerfassen.

DIMES 8 – Einfach und schnell in der Handhabung:

- Der aktuelle **Tagesbericht** übernimmt automatisch den Stand von gestern
- **Personal produktiv, unproduktiv, Regelarbeitszeit und Leistungsstand**
- Sie erfassen ggf. Änderungen bei **Arbeitskräften, Geräten und Arbeitszeit**
- Sie erfassen den **Leistungsstand abends (0...100% erledigt)**, der in der Projektstruktur angelegten Tätigkeiten
- Sie erfassen den **aktuellen Materialeinsatz (-verbrauch)**



Kaum zeitlicher Mehraufwand gegenüber manuellen Tagesberichten.



3 | SO SIEHT DAS AUS

Die **Kosten- und Leistungsrechnung** wird bei DIMES 8 auf **Gewerks-Ebene** erstellt. Es genügt hierbei, neben Personal- und Materialeinsatz, den jeweiligen Fertigstellungsgrad von Tätigkeiten im Tagesbericht mitzuerfassen.

Sie erfassen **Änderungen:**

- ✓ beim Personal
- ✓ bei Arbeitszeiten
- ✓ beim Fertigstellungsgrad
- ✓ bei Material- und Geräteeinsatz



Tagesbericht **24.09.2021**
 Projekt **SF_Wohnungsbau1**
 Projektnummer **2021.03**

Ersteller: Ihr Name

Wetterdaten Temp. Wind Niederschlag

7:00 Uhr
 12:00 Uhr
 17:00 Uhr

Eigenes Personal, nicht produktiv

Name	Beruf	Stunden
J.Meier	POLIER	4

Eigenes Personal, produktiv

Name	Beruf	Stunden
Heller	VORARBEITER	4
Huber	SPEZIALFACHARBEITER	4
Kellerer	FACHARBEITER	5
Körber	HELPER	5
Zeiler	SPEZIALFACHARBEITER	4

Fremdfirmen

Name	Gewerk		Anzahl Arbeiter
Kaiser	ERDARBEITEN	SUB	0

Geleistete Arbeiten (Effektivität: 0,92)

Bezeichnung	EL	% Ist Beginn	% Ist Ende	Material	Menge	Einheit
Kellerwände aussen (Bauteil 2)		95	100			
Ausschalarbeiten	X	0	100	Kein Material		
Kellerwände Innen (Bauteil 2)		0	58			
Tragmauern 24	X	0	100	Ziegel 240	600,00	Stk
Tragmauern 17.5	X	0	50	Ziegel 175	300,00	Stk

4 | IHRE VORTEILE BEI DIMES 8

- ✓ **Tagesbericht von heute** und jeder beliebigen Auswertungsperiode
- ✓ **Aktuellen Leistungsstand (heute) in Arbeitsstunden**, numerisch und graphisch
- ✓ **Aktuellen Leistungsstand in Euro**, numerisch
- ✓ **Stunden-SIV** für alle eigenen Stundenarten und jede beliebige Auswertungsperiode
- ✓ **Kosten-SIV** für jede beliebige Auswertungsperiode
- ✓ **Aktualisierter Gantt-Plan** der ausstehenden Arbeiten ab heute



**JETZT IST ZEIT FÜR NEUES.
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST!**

Weitere Informationen und
Downloads finden Sie auf
www.dimes8.de



DIMES 8

Dipl.-Ing. Karl Huber

Eichenstraße 12, 84416 Inning am Holz

Tel.: +49 8084 94125

kontakt@dimes8.de

www.dimes8.de
